

Kandidater: 33, 55, 167, 229, 279 & 356. Gruppenummer: 36.

Emnekode: BU5300

Emnenavn: IT og Prosjektledelse

Innleveringsdato: 20.04.2026

Mappeoppgave

Individuell mappeeksamen med elementer gjennomført i gruppe



Høyskolen Kristiania

Semester: Vår 2026

Denne besvarelsen er gjennomført som en del av utdannelsen ved Høyskolen Kristiania.

Høyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens metoder, resultater, konklusjoner eller anbefalinger.

Innholdsfortegnelse

1. Ledersammendrag.....	4
<i>Problem.....</i>	<i>4</i>
<i>Problemstilling.....</i>	<i>4</i>
<i>Prosjektbeskrivelse og målgruppe.....</i>	<i>4</i>
<i>Nytteverdi.....</i>	<i>4</i>
2. Forretningscase.....	5
<i>Problem og muligheter.....</i>	<i>5</i>
<i>Foreslått løsning og hvorfor den er levedyktig</i>	<i>5</i>
<i>Forventede gevinster</i>	<i>5</i>
<i>Kostnadsestimat</i>	<i>5</i>
<i>Hovedalternativer vurdert.....</i>	<i>5</i>
3. Prosjektmandat	6
<i>Prosjektmål</i>	<i>6</i>
<i>Omfang.....</i>	<i>6</i>
<i>Suksesskriterier</i>	<i>6</i>
<i>Teamroller.....</i>	<i>6</i>
<i>Antagelser og begrensninger.....</i>	<i>7</i>
4. Prosjektplan.....	7
<i>Valgt prosjektmetode med kort begrunnelse</i>	<i>7</i>
<i>Arbeidsnedbrytningsstruktur (WBS) og arbeidspakker (WP).....</i>	<i>8</i>
<i>Tidslinje med milepæler (Gantt).....</i>	<i>8</i>
<i>Ressursbruk og arbeidsestimat per arbeidspakke</i>	<i>9</i>
5. Risiko og risikoreduserende tiltak.....	9
6. Interessentanalyse.....	10
<i>Kommunikasjonsbehov.....</i>	<i>10</i>
7. Endringsstrategi	11

<i>Identifisert endring – skjerpende GDPR-krav fra datatilsynet.....</i>	<i>11</i>
<i>Hvem berøres?</i>	<i>11</i>
<i>Plan i møte med endring</i>	<i>11</i>
8. Finansiering og budsjettsammendrag	12
<i>Totalt estimerte kostnader</i>	<i>12</i>
<i>Hvordan midlene skal fordeles.....</i>	<i>12</i>
<i>Hvorfor prosjektet behøver ekstern støtte/finansiering</i>	<i>12</i>
Referanser:	14
Refleksjonsnotat, kandidatnummer 356:	15
Vedlegg:	16
Vedlegg 1: Fullstendig femårsprognose	16
<i>Vedlegg 2: Hovedmilepæler</i>	<i>17</i>
<i>Vedlegg 3: Avhengighetsnettverk</i>	<i>18</i>
<i>Vedlegg 4: Arbeidspakker</i>	<i>19</i>
<i>Vedlegg 5: Innsats- og kostnadsfordeling</i>	<i>20</i>
<i>Vedlegg 6: Ressursallokeringstabeller.....</i>	<i>21</i>
<i>Menneskelige ressurser</i>	<i>21</i>
<i>Tekniske ressurser</i>	<i>21</i>
<i>Vedlegg 7: Risikoer</i>	<i>23</i>
<i>Vedlegg 8: Risikokart.....</i>	<i>24</i>
<i>Vedlegg 9: Risikoreduserende strategi.....</i>	<i>25</i>
<i>Vedlegg 10: Interessentanalyse.....</i>	<i>26</i>
<i>Vedlegg 11: Maktmatrise</i>	<i>28</i>
<i>Vedlegg 12: Kommunikasjonsstrategi.....</i>	<i>29</i>
<i>Vedlegg 13: PROSCI-tabell</i>	<i>31</i>
<i>Vedlegg 14: Kommunikasjonsplan.....</i>	<i>33</i>
<i>Ekstra: Backlog.....</i>	<i>35</i>

1. Ledersammendrag

Leilo - en anmeldelsesplattform for leietakere

Problem

Det norske leiemarkedet mangler en anmeldelsesplattform som gir et ærlig og oversiktlig bilde av utleieboliger og utleiere. Mange leietakere opplever at informasjonen de får ved visning er mangelfull eller misvisende. Erfaringer fra tidligere leietakere er i liten grad tilgjengelig for offentligheten, noe som særlig rammer unge- og førstegangsleietakere. Nye leietakere risikerer å inngå leieforhold både med begrenset innsikt og mangelfull informasjon. Plattformen Leilo skal bidra til mer informerte beslutninger før inngåelse av leieforhold.

Problemstilling

Hvordan kan en digital anmeldelsesplattform gjøre erfaringene til tidligere leietakere tilgjengelig, slik at unge- og førstegangsleietakere kan ta tryggere og mer informerte valg i leiemarkedet?

Prosjektbeskrivelse og målgruppe

Leilo er et IS-prosjekt som omfatter utviklingen av en norsk plattform som systematiserer og tilgjengeliggjør anmeldelser av leiligheter og utleiere på ett sted, med hensikt om å øke forutsigbarheten i det norske leiemarkedet. Ifølge Cadle & Yeates (2008) innebærer et IS-prosjekt-utvikling og implementering av et nytt system for en kunde. Plattformen utvikles som en webapplikasjon og mobilapp, med kjernefunksjonaliteter som anmeldelsessystem for boliger og utleiere, søk og filtrering basert på valgte kategorier (adresse, sted, utleier, boligtilstand), kartvisning med markører for anmeldte boliger, samt et rapporterings- og modereringssystem for kvalitetssikring av innhold. All databehandlingen skjer i tråd med GDPR. Prosjektet retter seg primært mot unge og førstegangsleietakere i Norge.

Nytteverdi

Leilo skaper verdi på flere nivåer. Plattformen øker åpenheten i leiemarkedet ved å gjøre tidligere leietakeres erfaringer søkbare og tilgjengelige for alle. Utleiere som er kjent med plattformen vil ha sterkere motivasjon til å vedlikeholde boligene, noe som reduserer konfliktnivået mellom partene. Bedre informasjon før kontraktinngåelse bidrar til færre overraskelser og et mer rettferdig leiemarked. På sikt har plattformen også kommersielt potensial gjennom Premium-funksjoner og annonsering.

2. Forretningscase

Problem og muligheter

Skjulte feil som fukt, mugg eller ulovlig utleie kommer gjerne ikke frem før etter kontrakten er signert. Et godt eksempel er en sak fra Bergen fra 2024, der et bygg var godkjent for 8 soverom, men ble leid ut som 26 (Wiik, 2024). Dette er ikke et enkelttilfelle, men et eksempel på at det finnes lite åpen informasjon om hvordan boliger og utleiere faktisk opererer. Samtidig sitter tusenvis av tidligere leietakere med erfaring som kunne hjulpet andre. Problemet er bare at det ikke finnes en god måte å dele denne informasjonen på, noe som skaper tydelig markedsmulighet for Leilo.

Foreslått løsning og hvorfor den er levedyktig

Løsningen er levedyktig ettersom behovet er realistisk. Målgruppen av studenter og unge leietakere er relativt enkelt å nå. Dette er en aktiv gruppe på web og sosiale medier, noe som er avgjørende for å bygge en kritisk masse av anmeldelser tidlig.

Forventede gevinster

En av de mulige utfallene til Leilo er at plattformen bidrar til å redusere maktskjevheten mellom utleier og leietaker. På sikt ønsker vi at dette gir utleier insentiv til å vedlikeholde boligene, noe som igjen gir leietakere økt trygghet knyttet til boligmarkedet. Kommersielt ser vi potensialet i Premium funksjoner og annonsering fra år 3.

Kostnadsestimat

Prosjektet finansieres av Stud-ENT-ordningen med 1 000 000kr (Innovasjon Norge, u.å.). Utviklingen er estimert til 691 700kr (1040 timer til 600kr/t over 34 uker). I tillegg kommer engangskostnader på 317 400kr og løpende driftskostnader på 908 000kr i år 1. Ved behov kan budsjettet justeres gjennom redusert markedsføring, bruk av gratis kontorlokaler eller tilførsel av egenkapital. Fullstendig femårsprognose er vedlagt (se [vedlegg 1: Fullstendig femårsprognose](#)).

Hovedalternativer vurdert

Vi vurderte å integrere en vurderingsfunksjon i Finn.no, noe som ville gitt rask tilgang til en stor brukerbase. Dette ville gjort Leilo avhengig av en ekstern aktør med begrenset kontroll over personvern og utvikling. Vi landet derfor på en selvstendig plattform som best ivaretar prosjektets mål og verdier.

3. Prosjektmandat

Prosjektmål

Prosjektet har som mål å utvikle og lansere en norsk anmeldelsesplattform for boliger og utleiere, som gir unge og førstegangseietakere et bedre beslutningsgrunnlag før kontraktinngåelse. Plattformen skal lanseres innen uke 34.

Omfang

Innenfor omfang: Web- og mobilapplikasjon, brukerregistrering og autentisering, anmeldelsessystem, søk og filtrering, kartvisning, rapportering og moderering, GDPR-tilpasset databasebehandling med AES-256-kryptering og tilgangsstyring.

Utenfor omfang: Internasjonal lansering og integrasjon med eksterne markedsplasser som Finn.

Suksesskriterier

- MVP lansert innen uke 34, innenfor budsjett på 1 000 000 kr.
- Et tilstrekkelig antall anmeldelser tidlig i lanseringsfasen, slik at brukerne får meningsfulle søkeresultater.
- GDPR-dokumentasjon ferdigstilt og sikkerhetstesting gjennomført uten kritiske funn før beta-lansering.

Teamroller

I denne teamsettingen er sponsor og prosjektleder samme person. Sponsoren har ansvar for å sikre finansiering og representerer prosjektets forretningsmessige verdi (Cadle & Yeates, 2008, s. 45). Prosjektleder har ansvar for den daglige driften. Siden prosjektet har begrensede ressurser, har vi bestemt oss for å kombinere denne rollen. Dette bidrar til en enklere og mer effektiv styring i prosjektet.

1.1.1.1 Tabell med oversikt over rollefordeling

Navn	Rolle	Ansvar
Sofie	Prosjektleder	Fremdrift, risikohåndtering og sponsoransvar. Spesielt ansvar for at tester underveis blir utført og holder rapport over resultater.
Ole Even	Markeds- og økonomiansvarlig	Markedsføring med ansvar for alle budsjett og prognoser.
Thea	Cybersikkerhetsansvarlig	Personvern, sikkerhetsanalyser og sikkerhetstesting, administrerer tilganger.
Merethe	Utvikler (Frontend)	Endelig ansvar for UX/UI design, frontendutvikling og utbyggelse av prototype. Vedlikeholder løsning sammen med team.
Martin D.	Utvikler (Backend)	Endelig ansvar for databasehåndtering og backendutvikling. Vedlikeholder løsning sammen med team.
Martin R.	Utvikler (IT/Produktansvarlig)	Kartlegger funksjonaliteter, sikrer at løsningen dekker behovet til brukeren. Vedlikeholder løsning sammen med team.

Antagelser og begrensninger

Antagelser: Stud-ENT innvilger 1 000 000 kr, teamet holder full kapasitet.

Studentmålgruppen bidrar med anmeldelser tidlig nok til kritisk masse.

Begrensninger: Teamet består av studenter med begrenset erfaring innen AES-256-kryptering og GDPR-implementasjon. Tidsrammen på 34 uker er stram, og budsjettet må dekke utvikling, drift og markedsføring i et femårsperspektiv.

4. Prosjektplan**Valgt prosjektmetode med kort begrunnelse**

Prosjektet følger SCRUM som utviklingsmetode. SCRUM ble valgt fordi iterative utviklingsmetoder er særlig egnet for IT-prosjekter der krav kan utvikle seg underveis i prosjektet (Cadle & Yeates, 2008, s. 80-81). Ved å arbeide i korte sprinter med tydelige mål kan teamet levere målbar verdi tidlig, avdekke feil raskt og justere kursen basert på tilbakemeldinger. DSDM og V-modellen ble vurdert, men ansett som mindre fleksible gitt

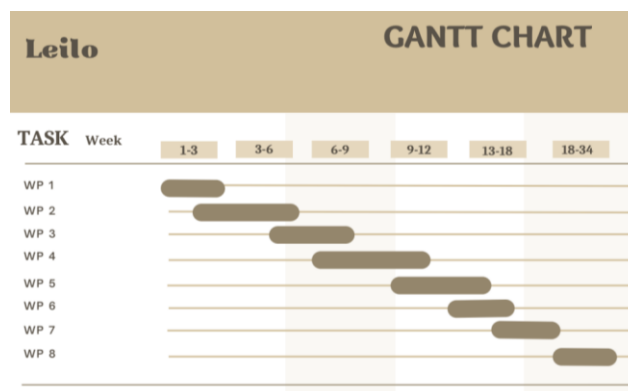
prosjektets behov for kontinuerlig tilpasning. En oversikt over prosjektets planlegging er tilgjengelig i vedlegg 2 og 3 (se [vedlegg 2: Hovedmilepæler](#) & [vedlegg 3: Avhengighetsnettverk](#)).

Arbeidsnedbrytningsstruktur (WBS) og arbeidspakker (WP)

Prosjektet er strukturert i åtte arbeidspakker som dekker hele utviklingsløpet fra oppstart til lansering. WP1 setter opp prosjektstruktur, backend, frontend og databasearkitektur. WP2 håndterer brukerautentisering, registrering og GDPR-tilpasning. WP3 omfatter anmeldelsessystemet der brukere kan skrive og vise vurderinger knyttet til spesifikke boliger og utleiere. WP4 implementerer søk, filtrering og kartvisning. WP5 dekker UI/UX-design og responsivt grensesnitt. WP6 håndterer kryptering, tilgangskorntoll og sikkerhetstesting. WP7 gir brukere samt administrator verktøy for rapportering og moderering av innhold. WP8 omfatter markedsplan, beta-test og offisiell lanseringskampanje. Fullstendig WBS tabell er tilgjengelig i vedlegg 4 (se [vedlegg 4: Arbeidspakker](#)).

Tidslinje med milepæler (Gantt)

Milepælene fungerer som formelle kontrollpunkter og er valgt ut basert på forretningsmålene til Leilo. De skal sikre strukturert fremdrift og kontinuerlig evaluering for å redusere sannsynligheten for avvik av prosjektets mål. Prosjektet løper fra uke 2 til uke 34, med prototype godkjenning i uke 16 og beta-lansering i uke 20 som de to viktigste kontrollpunktene underveis.



Designet av gruppen ved bruk av verktøyet Canva.

Gantt-diagrammet illustrerer hvordan arbeidspakkene er fordelt og strukturert over 34 uker, med overlappende faser der det er mulig for å optimalisere fremdriften.

Ressursbruk og arbeidsestimat per arbeidspakke

Estimatene er basert på en antatt gjennomsnittlig utviklingskostnad på 600,- per time. Totalt er 1040 timer fordelt over de åtte arbeidspakkene, til en samlet utviklingskostnad på 691 700 kr. Timeestimatene er fordelt etter kompleksitet og tekniske krav i hver arbeidspakke, der oppgaver som søk, filtrering og kart (WP4) samt brukerautentisering (WP2) krever flest ressurser. Ressursallokeringen er tilpasset den enkeltes kompetanseprofil og sikrer effektiv gjennomføring av arbeidspakkene. En fullstendig oversikt over tidsbruk, kostnader og ressursfordeling per arbeidspakke finnes i vedlegg 5 og 6 (se [vedlegg 5: Innsats- og kostnadsfordeling](#) & [vedlegg 6: Ressursallokeringstabeller](#)).

5. Risiko og risikoreduserende tiltak

Risikostyring er en sentral del av prosjektledelse, ettersom usikkerhet kan påvirke både kostnad, tidsplan og prosjektets leveranser (Cadle & Yeates, 2008, s. 267). Risikoene er identifisert med utgangspunkt i Boehms (1991) Top-10 risikorammeverk for programvareutvikling og er tilpasset Leilo. Risikofaktorene beregnes som produktet av sannsynligheten x innvirkning (skala 1-5), og brukes til å prioritere hvilke risikoer som krever umiddelbar oppfølging. Tiltakene reduserer sannsynligheten for at risikoene inntreffer, fremfor å håndtere konsekvensene i etterkant. Dette gjenspeiler en proaktiv tilnærming der sikkerhet, personvern og kvalitetskontroll bygges inn i utviklingsprosessen fra starten (Turley, u. å.). Scope creep (R8) er det eneste tilfellet der strategien er å unngå risikoen helt.

1.1.1.2 Oppsummerende tabell for de 5 høyest rangerte risikofaktorene

ID	Risiko	Sanns.	Innv.	Faktor	Tiltak	Strategi
R1	For optimistisk tidsplan	4	4	16	Legge inn buffertid mellom arbeidspakker og justere omfang fremfor å forlenge tidsplan	Redusere
R2	Manglende kompetanse i utviklingsteamet	3	4	12	Kartlegge kompetansegap tidlig og fordele oppgaver etter styrker, intern opplæring	Redusere
R7	Falske eller krenkende anmeldelser	4	3	12	Verifisering av leieforhold, rapporteringssystem med admin-moderering (WP7)	Redusere

R8	Scope creep – ukontrollert utvidelse av omfang	3	4	12	Tydelig MVP-avgrensning og krav godkjennes av produktansvarlig før de tas inn i sprint	Unngå
R6	Personvernbrudd /GDPR-svikt	2	5	10	Dataminimering, dokumentere sluttruiner og personvernerklæring før beta	Redusere

Fullstendig risikoregister, risikokart og risikoreduserende tiltak er tilgjengelig i vedlegg 7, 8 og 9 (se [vedlegg 7: Risikoer](#), [vedlegg 8: Risikokart](#) & [vedlegg 9: Risikoreduserende strategi](#)).

6. Interessentanalyse

Siden Leilo håndterer både brukerskapet innhold og personvernsopplysninger, er det avgjørende å ha kontroll over hvem som påvirker prosjektet og hvem som blir påvirket av løsningen. Identifisering og håndtering av interessenter er avgjørende for prosjektets suksess, fordi ulike aktører kan påvirke prosjektets beslutninger og fremdrift (Cadle & Yeates, 2008, s. 298). Vi skiller mellom interne og eksterne interessenter:

1.1.1.3 Oversikt over interessenter

Interne interessenter (del av prosjektet)	Eksterne interessenter (utenfor prosjektet)
Ansatte	Investor (Innovasjon Norge)
Intern DPO / infoSec (Thea)	Leietakere
Kundestøtte /service desk	Utleiere
Prosesseier / Kundestøtteledelse	Datatilsynet
Juridisk funksjon	Media/Konkurrenter

Interessenter er kartlagt etter makt og interesse. Fullstendig oversikt av interessenter og makt er tilgjengelig i vedlegg 10 og 11 (se [vedlegg 10: Interessentanalyse](#) & [vedlegg 11: Maktmatrise](#)).

Kommunikasjonsbehov

Basert på makt og interesse tilpasses kommunikasjonen til hver gruppe. Investor, ansatte, leietakere og utleiere har høy makt og høy interesse, som krever tett oppfølging. Intern DPO/infoSec godkjenner løsninger og rutiner løpende, og skiller bevisst fra Datatilsynet, som har høy formell makt, men lav daglig involvering og mottar primært samsvarsdokumentasjon knyttet til R6. Utleiere ivaretas gjennom rapporteringsfunksjonen i applikasjonen, noe som

også reduserer juridisk risiko knyttet til R7. IT-drift og kundestøtteledelse aktiveres i forkant av lansering. Konkurrenter overvåkes passivt, mens media kontaktes ved lansering eller ved uønskede hendelser som er knyttet til R5 og R7. Fullstendig oversikt over kommunikasjonsplan er tilgjengelig i vedlegg 12 (se [vedlegg 12: Kommunikasjonsstrategi](#)).

7. Endringsstrategi

Identifisert endring – skjerpende GDPR-krav fra datatilsynet

Ettersom Leilo tillater brukere å dele vurderinger av boliger og utleiere, kan strengere juridiske krav føre til behov for endringer i funksjonalitet og håndtering av data. Et konkret eksempel er en skjerpet tolkning av GDPR, der Datatilsynet krever at brukere eksplisitt samtykker til at anmeldelser kan knyttes til spesifikke adresser og utleier, samt at de til enhver tid har rett til å kreve sletting av egne anmeldelser (“Retten til å bli glemt”). I tillegg stiller plattformeiere som Apple Store og Google Play egne krav til apper som distribueres på deres enheter, blant annet knyttet til personvern og databehandling (Digitalsikkerhetsloven, 2023, § 10). Slike endringer er realistiske fordi EU og norske myndigheter kontinuerlig skjerper tilsynet med plattformer som håndterer brukerdata, innhold og personopplysninger (Datatilsynet, u.å.), samtidig som Apple og Google jevnlig oppdaterer sine retningslinjer for applikasjoner. Personvernrisiko er allerede identifisert som R6 i risikoregisteret. (Se [vedlegg 7 risikoer](#))

Hvem berøres?

Ansatte må gjøre tekniske endringer i applikasjonen for å følge oppdatert lovverk, blant annet i databasen og brukergrensesnittet, noe som kan gi økt arbeidsmengde og medføre forsinkelser. Investor må informeres om nødvendige endringer i tjenesten, hva de koster og hvorfor de er påkrevd. Det er viktig å formidle at endringene reduserer juridisk risiko på sikt. Intern DPO/infoSec har ansvar for å dokumentere samsvar overfor Datatilsynet. Leietakere må godta oppdaterte personvernavklaringer og informeres om hvilke rettigheter de har, inkludert retten til å slette egne data.

Plan i møte med endring

Dersom endringer inntreffer, vil disse håndteres strukturert i tråd med PROSCI rammeverket. Endringsledelse er viktig fordi organisatoriske endringer ofte skaper motstand dersom de ikke kommuniseres og implementeres på en systematisk måte (Cadle & Yeates, 2008, s. 335-337). Arbeidet vil fokusere på å etablere forståelse for endringen, skape motivasjon for å ta den i

bruk, sikre nødvendig kompetanse, praktisk gjennomføring og iverksette de nye rutinene i prosjektets daglige praksis (Prosci Inc. u. å.). Teamet informeres først i et ukentlig møte, etterfulgt av en intern workshop om GDPR og plattformkrav. Nødvendige tekniske endringer implementeres av utviklerne i teamet, før samsvarsdokumentasjon oversendes til Datatilsynet og oppdatert personvernerklæring publiseres i forkant av beta-lansering. Fullstendig PROSCI-tabell og kommunikasjonsplan er tilgjengelig i vedlegg 13 og 14 (se [vedlegg 13: PROSCI-tabell](#) & [vedlegg 14: Kommunikasjonsplan](#)).

8. Finansiering og budsjettsammendrag

Totalt estimerte kostnader

En kostnadsanalyse er et essensielt verktøy for å vurdere den økonomiske gjennomførbarheten av et prosjekt (Cadle & Yeates, 2008, s. 33). Leilo opererer med et femårsperspektiv der totale kumulative kostnader estimeres til 20 759 000kr. Det første driftsåret er det mest kostnadskrevende relativt til inntektsgrunnlag, med et totalt beløp på 1 225 400 kr totalt, hvorav 317 400kr er engangskostnader og 908 000kr er løpende driftskostnader. Kostnadene vokser i takt med planlagt skalering og teamutvidelse, og når 8 026 600kr i år 5, primært drevet av personalkostnader og markedsføring. Fullstendig oversikt er tilgjengelig i vedlegg 1 (se [vedlegg 1: Fullstendig fem års prognose](#)).

Hvordan midlene skal fordeles

Budsjettet er strukturert etter to hovedkategorier: engangskostnader og løpende kostnader. Engangskostnadene på 317 000kr dekker etablering av AS inkludert juridisk rammeverk og personvernerklæring (80 000kr), hardware til teamet (82 400kr), utvikling av design og initial penetrasjonstesting (110 000kr) samt lanserings-markedsføring (45 000kr). De løpende kostnadene i år 1 på 908 000kr fordeles på skyinfrastruktur (Azure), programvarelisenser, juridisk og GDPR-compliance, markedsføring og drift. I år 1 er lønnskostnader satt til 0kr, da teamet opererer som studentbedrift. Fra år 2 innføres lønnskostnader som raskt bli den største enkeltposten, i takt med nasjonal vekst og teamutvidelse. Utviklingskostnadene knyttet til arbeidspakkene WP1-WP8 er estimert til 691 700kr, basert på 1 040 timer ca. 600kr/t, og inngår i det totale budsjettet. (for WP1-WP8 se [Vedlegg 4: Arbeidspakker](#)).

Hvorfor prosjektet behøver ekstern støtte/finansiering

Leilo er i tidlig fase uten eksisterende inntektsstrøm, og kostnadene i år 1 alene overstiger hva et studentteam kan dekke med egenkapital. Det er derfor søkt om 1 000 000kr gjennom Stud-

ENT-ordningen hos Innovasjon Norge, som er et tilskudds program øremerket studentdrevet entreprenørskap (Innovasjon Norge, u.å.). Startkapitalen er dimensjonert til å dekke samtlige engangskostnader og løpende driftskostnader i år 1, og skal gi prosjektet nødvendig tid og ressurser til å utvikle en MVP, nå kritisk brukermasse og etablere troverdighet i markedet - før Fremtidig inntektsmodeller kan realiseres. Som beskrevet i konseptgrunnlaget (Oppgave 2) kan eventuelle underskudd håndteres gjennom redusert markedsføringsbudsjett, bruk av gratis kontorlokaler eller supplerende egenkapital.

Referanser:

Cadle, J. & Yeates, D. (2008). *Project Management for Information Systems* (5. Utg.). Stakeholders.

<https://www.greatertzaneen.gov.za/documents/news/Project%20management%20for%20information%20system%205th.pdf>

Canva (u.å.). *Canva*.

<https://www.canva.com/>

Datatilsynet. (u.å.). *Virksomhetenes plikter*. Hentet 22. Januar 2026, fra:

<https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/>

Innovasjon Norge. (u.å.). *Tilskudd til Student-Entreprenørskap (STUD-ENT)*. Innovasjon Norge.

<https://www.innovasjon norge.no/tjeneste/tilskudd-til-studententreprenorskap-stud-ent>

Lov om Digital sikkerhet (Digitalsikkerhetloven). (2023). *LOV-2023-12-20-108*. Lovdata.

<https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2023-12-20-108>

Prosci Inc. (u. å.) *Change Management*. Hentet 16. April 2026, fra:

<https://www.prosci.com/change-management>

Redaksjonen. (2021, januar. 15). *Styrker, svakheter, muligheter og trusler: Slik gjør du en effektiv SWOT-analyse*. Digital Norway.

[, svakheter, muligheter og trusler: Slik gjør du en effektiv SWOT-analyse](#)

Turley, F. (u. å.) *Risk management approach*. PRINCE2 wiki. Hentet 16. April 2026, fra:

<https://prince2.wiki/management-products/baselines/management-approaches/risk/>

Vikøren, B. M., & Pihl, R. (2025, mai. 15). *SWOT-analyse*. Store norsk leksikon.

[SWOT-analyse – Store norske leksikon](#)

Wiik, S. (2024, 24. Oktober). *Bygg i Bergen er godkjent for 8 soverom. Kommunen fant 26 huseier risikerer gigantbot*. Bergensavis (BA).

<https://www.ba.no/bygget-i-bergen-er-godkjent-for-8-soverom-kommunen-fant-26-huseier-risikerer-gigantbot/s/5-8-2787866>

Refleksjonsnotat, kandidatnummer 356:

I Leilo-prosjektet har jeg hatt rollen som markedsansvarlig, med ansvar for markedsføringsstrategi, analyse og lansering (wp8). Gjennom semesteret har jeg bidratt til kostnadsanalysen, interessentanalysen og kommunikasjonsstrategien, der markedsaspektet har vært en gjennomgående tråd i flere av leveransene.

Den mest betydningsfulle faglige lærdommen kom gjennom arbeidet med kostnadsanalysen. Cadle & Yeates (2008) s. 33 beskriver kostnadsanalysen som et essensielt verktøy for å vurdere den økonomiske gjennomførbarheten av et prosjekt, og dette ble tydelig i praksis når vi skulle oversette prosjektideen til konkrete tall over et femårsperspektiv. Det å skille mellom engangskostnader og løpende kostnader, og forstå hvordan kostnadsstrukturen endrer seg med vekst og skalering, var mer krevende enn forventet. Særlig var det utfordrende å estimere realistiske markedsføringskostnader uten historiske data, noe som understreket verdien av å forankre estimater i eksplisitte forutsetninger fremfor løse antakelser.

En sentral lærdom fra prosjektet er også hvordan interessentanalysen direkte påvirker kommunikasjonsstrategien. Gjennom arbeidet med oppgave 9 of 10 ble det tydelig at ulike interessenter ikke bare har ulike forventninger, men krever fundamentalt ulike budskap og kanaler. Som markedsansvarlig var dette særlig relevant. Kommunikasjon mot leietakere som primærmålgruppe krever en helt annen tilnærming enn formell dokumentasjon rettet mot Datatilsynet. Denne differensieringen var noe jeg ikke hadde reflektert grundig over før kurset, og det har endret måten jeg tenker på målgruppe rettet kommunikasjon generelt. En annen viktig erkjennelse kom gjennom arbeidet med endringsledelse i oppgave 10. Prosjektet tok utgangspunkt i Prosci-modellens tre faser – forbedre, håndtere og forsterke endring – og anvendte dette på en konkret GDPR-relatert endring i Leilo. Det å strukturere endringsledelse som en systematisk prosess med tydelige handlingspunkter, interessenter og tidslinjer, var en ny måte å tenke på for meg. Tidligere ville jeg nok håndtert en slik endring mer reaktivt, uten en strukturert plan. Kurset har gitt meg en forståelse av at endringer i IT-prosjekter sjelden er tekniske alene – de har alltid en menneskelig og kommunikasjonsmessig dimensjon som krever like mye oppmerksomhet som selv den tekniske løsningen. Kursets rammeverk for IT-prosjektledelse har samlet gitt meg et strukturert språk for å forstå sammenhengen mellom økonomi, risiko, interessenthåndtering og endringsledelse – kunnskap jeg vil ta med videre både akademisk og profesjonelt.

Arbeidet i Leilo-gruppen har også gitt verdifull erfaring med prosjektarbeid i praksis. Teamet besto av seks medlemmer med ulik faglig bakgrunner og roller, noe som både var en styrke og en utfordring. Den tverrfaglige sammensetningen med kompetanse innen utvikling, sikkerhet, design og markedsføring gjorde at vi kunne angripe problemstillinger fra flere vinkler samtidig og løsningene ble bedre av det. Samtidig krevde det bevisst koordinering å sikre at alle bidro inn mot et felles mål, særlig i perioder med overlappende leveranser og tidspress.

Ser jeg tilbake på semesteret som helhet, er den viktigste enkeltinnsikten at IT-prosjektledelse er en tverrfaglig disiplin. Kostnadsanalysen lærte meg å tenke økonomisk og forutsetningsbasert, interessentanalysen lærte meg å differensiere kommunikasjon etter mottaker, og Prosci-rammeverket lærte meg at endringer må forberedes like grundig som de må gjennomføres. Disse perspektivene henger tett sammen i praksis — en svak interessentanalyse gir dårlig kommunikasjonsplan, og en dårlig kommunikasjonsplan undergraver endringsprosessen. I fremtidige prosjekter vil jeg jobbe bevisst med å se disse dimensjonene i sammenheng fra starten, fremfor å behandle dem som separate leveranser.

Vedlegg:

Vedlegg 1: Fullstendig femårsprognose

Leilo - Kostnadsanalyse

App for privat vurdering av utleieboliger

Femårsperspektiv med 1 million kr startsum

Kategori	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5
ENGANGSKOSTNADER					
Etablering	80 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
- Etablering AS (inkl. aksjekapital)	30 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
- Brukervilkår og tjenestevilkår	15 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
- Personvernerklæring og DPIA	35 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Hardware	82 400 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
- Bærbare PC'er (6 stk)	48 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
- Skjermer (6 stk)	10 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
- Docking stasjoner (6 stk)	6 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
- Mus og tastatur (6 sett)	3 200 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
- Headset (6 stk)	3 200 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
- Nettverksutstyr	12 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Utvikling (engangsinnsett)	110 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
- App-design og UX/UI	40 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
- Logo og visuell identitet	25 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
- Forklaringvideo produksjon	30 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
- Penetrasjonstesting (initial)	15 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Markedsføring (engangs)	45 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
- Pressemelding og mediekitt	10 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
- Markedsføringsmaterieill	15 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
- Lanserings-event	20 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Sum engangskostnader	317 400 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
LØPENDE KOSTNADER (ÅRLIGE)					
Infrastruktur (Cloud)					
- Azure App Service	36 000 kr	48 000 kr	72 000 kr	90 000 kr	108 000 kr
- Azure SQL Database	30 000 kr	45 000 kr	60 000 kr	75 000 kr	90 000 kr
- Backup & disaster recovery	6 000 kr	8 000 kr	10 000 kr	12 000 kr	14 000 kr
Lisenser - Programvare					
- JetBrains lisenser (6)	8 000 kr	8 000 kr	10 000 kr	12 000 kr	14 000 kr
- Figma Professional	15 000 kr	15 000 kr	20 000 kr	25 000 kr	30 000 kr
- Microsoft 365 Business (6)	8 000 kr	10 000 kr	15 000 kr	20 000 kr	25 000 kr
- Azure DevOps	6 000 kr	8 000 kr	10 000 kr	12 000 kr	14 000 kr
Lisenser - Tredjepart					
- SMS-verifisering	10 000 kr	25 000 kr	50 000 kr	75 000 kr	100 000 kr
- E-posttjeneste	5 000 kr	10 000 kr	20 000 kr	30 000 kr	40 000 kr
- Analytics	8 000 kr	15 000 kr	30 000 kr	45 000 kr	60 000 kr
Juridisk & Compliance					
- Løpende juridisk rådgivning	30 000 kr	40 000 kr	50 000 kr	60 000 kr	70 000 kr
- GDPR compliance verktøy	8 000 kr	10 000 kr	12 000 kr	15 000 kr	18 000 kr
- Penetrasjonstesting (årlig)	15 000 kr	20 000 kr	25 000 kr	30 000 kr	35 000 kr
- Ansvarsforsikring	20 000 kr	25 000 kr	30 000 kr	35 000 kr	40 000 kr
- Cyberforsikring	10 000 kr	12 000 kr	15 000 kr	18 000 kr	21 000 kr
Markedsføring					
- Digital annonsering	260 000 kr	400 000 kr	600 000 kr	800 000 kr	1 000 000 kr
- Influencer-samarbeid	40 000 kr	80 000 kr	150 000 kr	200 000 kr	250 000 kr
- Content creator	50 000 kr	80 000 kr	120 000 kr	150 000 kr	180 000 kr
- PR-byrå	60 000 kr	100 000 kr	150 000 kr	200 000 kr	250 000 kr
- Events og messer	20 000 kr	40 000 kr	80 000 kr	120 000 kr	160 000 kr
Drift					
- Moderasjonsverktøy	15 000 kr	25 000 kr	40 000 kr	60 000 kr	80 000 kr
- Kundeservice (deltid)	150 000 kr	300 000 kr	500 000 kr	700 000 kr	900 000 kr
- Kontor	48 000 kr	96 000 kr	150 000 kr	200 000 kr	250 000 kr
- Regnskaps tjenester	15 000 kr	20 000 kr	30 000 kr	40 000 kr	50 000 kr
- Diverse operasjonelt	35 000 kr	50 000 kr	80 000 kr	100 000 kr	120 000 kr
Personalkostnader					
- Lønn gründere/utviklere	0 kr	400 000 kr	1 200 000 kr	2 400 000 kr	3 600 000 kr
- Arbeidsgeberavgift (14,1%)	0 kr	56 400 kr	169 200 kr	338 400 kr	507 600 kr
Sum løpende kostnader	908 000 kr	1 946 400 kr	3 698 200 kr	5 862 400 kr	8 026 600 kr
TOTALT PER ÅR	1 225 400 kr	1 946 400 kr	3 698 200 kr	5 862 400 kr	8 026 600 kr
Kumulativ kostnad	1 225 400 kr	3 171 800 kr	6 870 000 kr	12 732 400 kr	20 759 000 kr

FORUTSETNINGER OG NOTATER

År 1: MVP-utvikling og lansering i Oslo/Bergen. 6 gründere arbeider som studentbedrift. Mål: 5,000 brukere

År 2: Ansettelse av 2 heltidsutviklere. Nasjonal ekspansjon. Mål: 25,000 brukere

År 3: Team på 6 personer. Nordisk ekspansjon. Mål: 100,000 brukere

År 4-5: Fortsatt vekst og skalering i nordiske markeder

Kostnadsopptimalisering:

- Azure Reserved Instances kan spare 30-40% fra år 2
- Automatisert moderering reduserer manuelle kostnader over tid

Fargeforklaring:

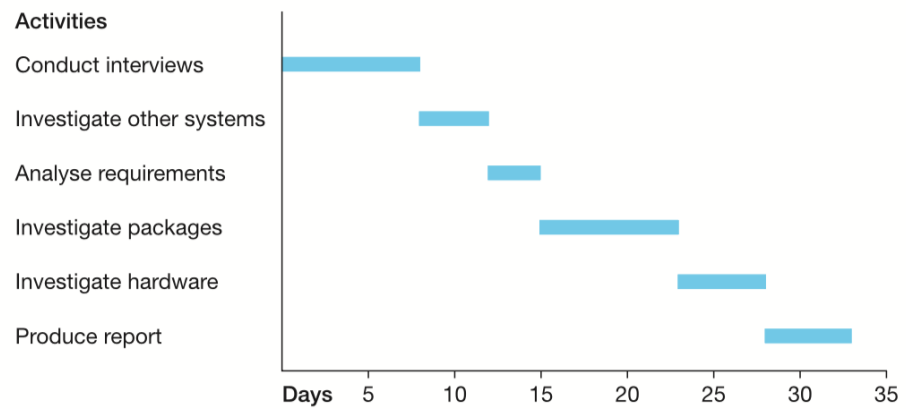
- Blå tekst = Hardkodede verdier (input)
- Svart tekst = Formler og beregninger

[Tilbake til tekst: 1. Kostnadsestimat](#)[Tilbake til tekst: 8. Finansiering og budsjettsammendrag.](#)

Vedlegg 2: Hovedmilepæler

Kategori	Beskrivelse	Dato
Prosjektinitiering	Oppstartsmøter, avklaring av roller og ansvarsområder, fastsette mål og godkjenning av finansiering.	Uke 2
Utvikling av grunnleggende funksjonaliteter (MVP)	Design av UI/UX, utvikling av brukerregistrering og kjernefunksjonalitet	Uke 4
Prototype	Klikkbare prototype ferdig	Uke 16
Sikkerhetstest	Gjennomført sikkerhetsgjennomgang og GDPR kontroll	Uke 17
Beta lansering	Begrenset lansering til testbrukere	Uke 20
Evaluerings	Evaluerings av tilbakemeldinger og videre prioritering basert på disse	Uke 26
Full lansering av Leilo	Offisiell lansering av plattformen sammen med lanseringskampanje/markedsføring	Uke 34
Videreutvikling	Innsamling av tilbakemeldinger, implementering av nye funksjoner basert på brukeratferd og markedstrender	2027

[Tilbake til teksten](#)

Vedlegg 3: Avhengighetsnettverk**Figure 10.1** Dependency network with activity durations

[Tilbake til tekst.](#)

Vedlegg 4: Arbeidspakker

WP	Navn	Beskrivelse
WP1	Prosjektstart og arkitektur	Oppsett av prosjektstruktur, backend, frontend og databasearkitektur
WP2	Brukerautentisering	Utvikling av registrering, innlogging og brukerhåndtering
WP3	Anmeldelsessystem	Funksjonalitet for å skrive, lagre og vise anmeldelser
WP4	Søk, filtrering og kart	Implementere søk etter bolig, utleier eller sted
WP5	UI/UX design	Design av brukergrensesnitt og design
WP6	Sikkerhet og GDPR	Kryptering, tilgangskontroll og sikkerhetstesting
WP7	Moderering og rapportering	System for rapportering og håndtering av upassende innhold
WP8	Markedsføring og lansering	Beta-testing, markedsføring og lanseringskampanje

[Tilbake til teksten: 4. Arbeidsnedbrytningsstruktur](#)

[Tilbake til teksten: 8. Hvordan finansiering skal fordeles](#)

Vedlegg 5: Innsats- og kostnadsfordeling

WP	Arbeidspakke	Estimert periode	Estimert timer	Ressurser	Kostnad
WP1	Prosjektstart og arkitektur	Uke 1-3	120	Martin R., Sofie	79 200,-
WP2	Brukerautentisering	Uke 2-6	160	Martin D., Thea	104 000,-
WP3	Anmeldelsessystem	Uke 4-7	100	Martin D., Merethe, Thea	67 500,-
WP4	Søk, filtrering og kart	Uke 6-10	180	Martin D., Merethe, Martin R.	117 000,-
WP5	UI/UX design	Uke 9-14	160	Merethe, Martin R.	104 000,-
WP6	Sikkerhet og GDPR	Uke 12-17	120	Thea	90 000,-
WP7	Moderering og rapportering	Uke 14-18	80	Martin D., Merethe, Thea	52 000,-
WP8	Markedsføring og lansering	Uke 18 -34	120	Ole Even, Sofie	78 000,-
Total		1-34	1040		691 700,-

[Tilbake til teksten: 4. Ressursbruk og arbeidsestimat per pakke](#)

[Tilbake til teksten: 8. Hvordan midlene skal fordeles.](#)

Vedlegg 6: Ressursallokeringstabeller***Menneskelige ressurser***

Ressurs	Rolle	WP	Kompetanse
Sofie	Prosjektleder	WP1, WP8	Fremdrift, koordinering, budsjett og risikohåndtering
Martin D.	Backend utvikler	WP2, WP3, WP4, WP7	API, SQLite, C# og .NET
Merethe	Frontend utvikler / UX utvikler	WP3, WP4, WP5, WP7	Brukergrensesnitt og UI/UX
Martin R.	IT / Produktansvarlig	WP1, WP4, WP5	Funksjonaliteter og kravanalyse
Thea	Cybersikkerhet	WP2, WP6, WP7	GDPR, pentester og tilgangskontroll
Ole Even	Markedsansvarlig	WP8	Markedsstrategi, kampanje og lansering

Tekniske ressurser

Ressurs	Formål	Ansvarlig
C#, .NET	Utvikle API og databehandling	Martin D.
JavaScript, React, HTML, CSS	Utvikle brukergrensesnitt og interaktive funksjoner	Merethe
Figma	Utvikle design, prototype og brukeropplevelse	Merethe
SQLite	Lagring av brukerdata, anmeldelser og boligdata i databasen	Martin D
Git / GitHub	Versjonskontroll og samarbeid mellom utviklere	Martin D., Merethe
Cloud-platform/	Infrastruktur og drift	Martin D.
Kryptering AES-256	Beskytte sensitiv data og sikker lagring av data	Thea

Pentesting/Sikkerhetsrevisjon	Testing av sikkerhet og identifisering av sårbarheter	Thea
Analyse og markedsverktøy	Analyse av brukeradferd og markedsføringsstrategi	Ole Even
Teams	Kommunikasjon mellom teammedlemmene	Sofie
Google drive	Dokumentering underveis av prosjektet	Sofie

[Tilbake til teksten.](#)

Vedlegg 7: Risikoer

	Risiko	Sannsynlighet (1-5)	Innvirkning (1-5)	Risikofaktor	Kategori
R1	For optimistisk tidsplan for prosjektet	4	4	16	Tidsplan
R2	Manglende kompetanse i utviklingsteamet	3	4	12	Personal
R3	Teknisk kompleksitet er for høy	3	4	12	Teknisk
R4	Appen er treg og skalerer dårlig	2	4	8	Ytelse
R5	Datainnbrudd – uautorisert tilgang	2	5	10	Sikkerhet
R6	Personvernbrudd – GDPR-svikt	2	5	10	Juridisk
R7	Flaske eller krenkende anmeldelser	4	3	12	Omdømme
R8	Scope creep – ukontrollert utvidelse av omfang	3	4	12	Styring

[Tilbake til teksten: 5. Risiko](#)

[Tilbake til teksten: 7. Endringsstrategi](#)

Vedlegg 8: Risikokart

Sannsynlighet/ Konsekvens	1 Svært lite sannsynlig	2 Lite Sannsynlig	3 Sannsynlig	4 Ganske Sannsynlig	5 Svært Sa synlig
5 Katastrofal					
4 Svært Stor			R2 R3 R4 R8	R1	
3 Stor				R7	
2 Middels					R5 R6
1 Liten					

[Tilbake til teksten.](#)

Vedlegg 9: Risikoreduserende strategi

	Risiko	Strategi	Tiltak
R1	For optimistisk tidsplan	Redusere	Legge inn buffertid mellom arbeidspakker og justere omfang fremfor å forlenge tidsplan
R2	Manglende kompetanse i utviklingsteamet	Redusere	Kartlegge kompetansegap tidlig og fordele oppgaver etter styrker. Bruke dokumentasjon og opplæring ved behov.
R3	Teknisk kompleksitet er for høy	Redusere	Prioritere MVP-funksjonalitet og utsette komplekse funksjoner til senere sprinter
R4	Appen er treg og skalerer dårlig	Redusere	Ytelsestesting tidlig i utviklingen og optimalisering av databaser-spørringer før lansering
R5	Datainnbrudd	Redusere	AES-256-kryptering, rollebaserte slutrutiner og penetrasjonstesting (WP6)
R6	Personvernbrudd - GDPR	Redusere	Dataminimering, dokumentere sluttruiner og personvernerklæring før beta.
R7	Falske/krenkende anmeldelser	Redusere	Verifisering av leieforhold, rapporteringssystem med admin-moderering (WP7)
R8	Scope creep	Unngå	Tydelig MVP-avgrensing og krav godkjennes av produktansvarlig før de tas inn i sprint

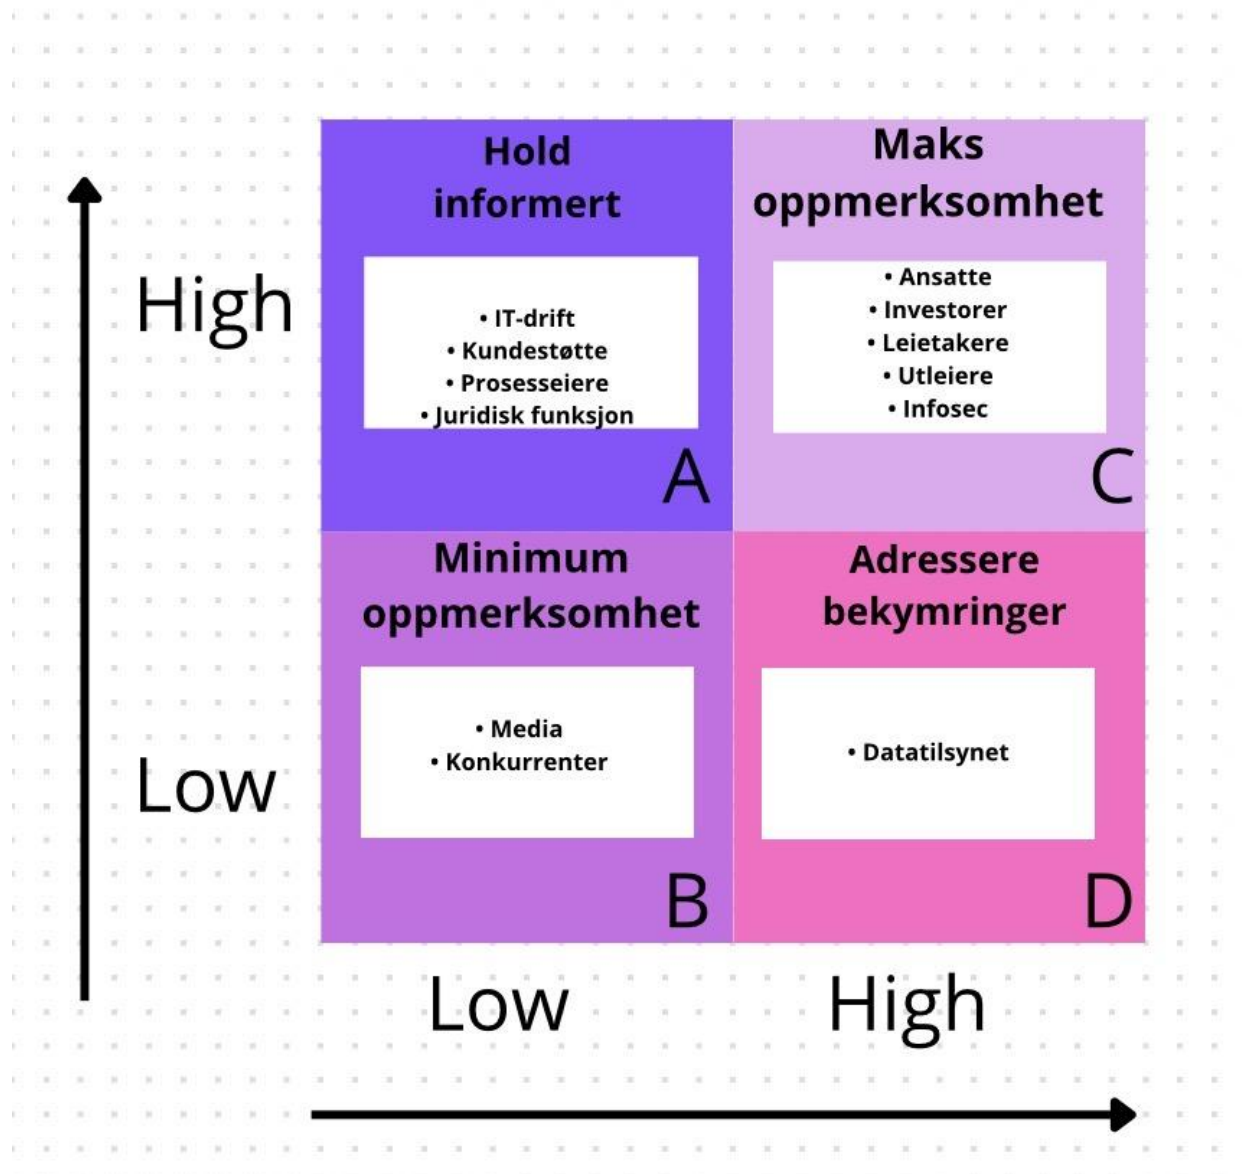
[Tilbake til teksten.](#)

Vedlegg 10: Interessentanalyse

Interessent	Interesse	Makt	Forventninger	Kommunikasjon
Investor	Høy	Høy	Fremdrift mot milepæler, synlig verdi av midler (1mil)	Statusrapporter hver 2. uke, Sprint Review
Ansatte	Høy	Høy	Tydelige roller, åpen kommunikasjon og faglig utvikling	Ukentlige teammøter, en til en møter, oppdateringer og resultater
Leietakere	Høy	Høy	Trygg, brukervennlig plattform med ærlige boligvurderinger	Beta-tester, brukerundersøkelser og sosiale medier
Datatilsynet	Lav	Høy	Etterlevelse av GDPR, dokumentert personvernerklæring	Offisiell dokumentasjon, personvernerklæring og samsvardokumentasjon ved behov
Utleier	Medium	Høy	Rettferdig behandling og mulighet til å behandle feilaktige boligvurderinger	Rapporteringsfunksjon i app
Intern DPO/infoSec (Thea)	Høy	Høy	Sikre at løsning og behandlingsrutiner er GDPR-konforme og internt godkjent	Sprint reviews og sikkerhetsdokumentasjon
IT-drift/support	Medium	Lav	Klare rutiner for overvåkning, logging, SLA og incident-håndtering etter lansering	Driftsplan utarbeides i WP8, statusmøter ved overlevering
Kundestøtte / service desk	Medium	Lav	Klare rutiner for support, tilgang til feillogger og FAQ for brukere	Opplæring før lansering, interne møter, supportdokumentasjon

Prosesseier / kundestøtteledelse	Medium	Lav	Effektive rutiner for håndtering av brukerhenvendelser og rapporterte anmeldelser	Workshops, interne møter og opplæring i nye prosesser
Juridisk funksjon	Medium	Lav	Avklaring ved brukerklager, ærekrenkelsessaker og leverandørkontrakter	Konsulteres ved behov, kontrakter gjennomgås ved oppstart og lansering
Konkurrenter	Lav	Lav	Oversikt over nye markedsstrategier	Løpende konkurranseovervåkning
Media	Lav	Lav	Synlighet ved lansering	Pressemelding ved lansering, sosiale medier

[Tilbake til teksten.](#)

Vedlegg 11: Maktmatrise

[Tilbake til teksten.](#)

Vedlegg 12: Kommunikasjonsstrategi

Interessent	Budskap	Kanal	Frekvens	Ansvarlig
Ansatte (teamet)	Hva endres, hvorfor og hvem gjør hva	Team møte + Google Drive	Ukentlig i endringsperioden	Sofie
Investor	Endringen reduserer juridisk risiko og sikrer videre fremdrift	Statusrapport + Sprint review	Annenhver uke	Sofie
Datatilsynet	Dokumentert samsvar med GDPR-krav	Offisiell samsvarsdokumentasjon	Ved ferdigstillelse (uke 19)	Thea
Leietakere	Oppdaterte personvernerklæring	In-app melding + e-post	Ved lansering av endring	Merethe/ Ole Even
Utleiere	Informasjon om nye regler for vurdering og	Rapporteringsfunksjon i app + e-post	Ved lansering	Ole Even
Intern DPO/ infoSec	Løsning og behandlingsrutiner må godkjennes før lansering	Sprint reviews + sikkerhetsdokumentasjon	Løpende i endringsperioden	Thea
Juridisk funksjon	Avklaring ved brukerklager og gjennomgang av kontrakter	Konsultasjon ved behov	Ved oppstart og lansering	Sofie/ Thea
IT-drift/ support	Rutiner for overvåkning, logging og incident-håndtering	Driftsplan + statusmøter	Ved overlevering + løpende	Thea
Kundestøtte / service desk	Opplæring i nye prosesser, FAQ og tilgang til feillogger	Opplæringsmøte + supportdokumentasjon	Før lansering	Merethe

Prosesseier/ kundestøttel edelse	Effektive rutiner for håndtering av brukerhenvendelser	Workshops + interne møter	Før og etter lansering	Sofie
Media	Ingen aktiv kommunikasjon i denne fasen			
Konkurrent er	Ikke relevant - overvåkes - passivt		Løpende	Ole Even

[Tilbake til teksten.](#)

Vedlegg 13: PROSCI-tabell

Fase	Handlingspunkt	Interessent	Tidslinje	Risiko
Fase 1 – Preparing for Change	Kartlegge hva endringen krever teknisk og juridisk	Ansatte	Uke 1	R6
	Vurdere motstand og kapasitet i teamet	Ansatte	Uke 1	R2
	Oppdatere backlog med nye krav knyttet til samtykke og sletting	Ansatte	Uke 1–2	R8
	Informere investor om endringen og at den reduserer juridisk risiko	Investor	Uke 1	R1
	Orienterer intern DPO/infoSec om planlagte endringer	Intern DPO/infoSec	Uke 1	R6
	Informere juridisk funksjon om GDPR-tiltak og kontraktsgjennomgang	Juridisk funksjon	Uke 1	R6
Fase 2 – Managing Change	Intern gjennomgang av GDPR-krav – hva må endres og hvem gjør hva	Ansatte	Uke 2–3	R6
	Implementere samtykkeløsning i brukergrensesnitt	Ansatte	Uke 3–5	R3, R6
	Implementere "slett min konto"-funksjonalitet i database	Ansatte	Uke 3–5	R3, R5
	Ferdigstille personvernerklæring og samsvarsdokumentasjon	Datatilsynet	Uke 4–6	R6
	Godkjenning av løsning og behandlingsrutiner	Intern DPO/infoSec	Uke 4-5	R6
	Sprint Review – vise fremdrift til investor	Investor	Uke 4	R1

	Teste ny funksjonalitet med utvalgte brukere	Leietakere	Uke 6	R4, R7
	Opplæring av IT-drift/support i nye rutiner og logging	IT-drift/support	Uke 5-6	R3
	Opplæring av kundestøtte i nye prosesser og FAQ	Kundestøtte/service desk	Uke 5-6	R7
	Gjennomgang av kontrakter og juridiske risikoer	Juridisk funksjon	Uke 3-4	R6
Fase 3 – Reinforcing Change	Lansere oppdatert versjon med in-app melding og e-post	Leietakere / utleiery	Ved lansering	R7
	Lanseringsrapport til investor	Investor	Ved lansering	R1
	Pressemelding og synlighet i sosiale medier	Media	Ved lansering	-
	Samle tilbakemeldinger fra brukere og identifisere gap	Leietakere	Uke 13+	R4, R7
	Løpende overvåkning av GDPR-samsvar	Datatilsynet	Uke 13+	R5, R6
	Løpende konkurranseovervåkning	Konkurrenter	Uke 13+	-
	Overvåkning, logging og incident-håndtering etter lansering	IT-drift/support	Uke 13+	R3, R5
	Håndtering av brukerhenvendelser og rapporterte anmeldelser	Prosesseier/kundestøtteledelse	Uke 13+	R7
	Feire og anerkjenne teamets innsats	Ansatte	Ved lansering	–

[Tilbake til teksten.](#)

Vedlegg 14: Kommunikasjonsplan

Interessent	Budskap	Kanal	Frekvens	Ansvarlig
Ansatte (teamet)	Hva endres, hvorfor og hvem gjør hva	Team møte + Google Drive	Ukentlig i endringsperioden	Sofie
Investor	Endringen reduserer juridisk risiko og sikrer videre fremdrift	statusrapport + Sprint review	Annenhver uke	Sofie
Datatilsynet	Dokumentert samsvar med GDPR-krav	Offisiell samsvarsdokumentasjon	Ved ferdigstillelse (uke 19)	Thea
Leietakere	Oppdaterte personvernerklæring	In-app melding + e-post	Ved lansering av endring	Merethe/ Ole Even
Utleiere	Informasjon om nye regler for vurdering og	Rapporteringsfunksjon i app + e-post	Ved lansering	Ole Even
Intern DPO/InfoSec	Løsning og behandlingsrutiner må godkjennes før lansering	Sprint reviews + sikkerhetsdokumentasjon	Løpende i endringsperioden	Sofie
Juridisk funksjon	Avklaring ved brukerklager og gjennomgang av kontrakter	Konsultasjon ved behov	Ved oppstart og lansering	Sofie/ Thea
IT-drift/ support	Rutiner for overvåkning, logging og incident-håndtering	Driftsplan + statusmøter	Ved overlevering + løpende	Thea/ Martin D.

Kundestøtte/ service desk	Opplæring i nye prosesser, FAQ og tilgang til feillogger	Opplæringsmøte + supportdokumentasjon	Før lansering	Merethe
Prosesseier/ kundestøtteleder	Effektive rutiner for håndtering av brukerhenvendels er	Workshops + interne møter	Før og etter lansering	Sofie
Media	Ingen aktiv kommunikasjon i denne fasen	-	-	-
Konkurrenter	Ikke relevant - overvåkes - passivt	-	Løpende	Ole Even

[Tilbake til teksten.](#)

Ekstra: Backlog

PBI	Sprint	Sprint Planning	Sprint Backlog	Status
Prosjekt oppsett og arkitektur	1	Etablere branch struktur og grunnarkitektur	Sette opp backend og frontend prosjekt. Koble til SQLite	Ferdig
Applikasjonsstruktur	1	Lage grunnstrukturen for applikasjonen	Ruting mellom sider. Etablere layout og navigasjonsmeny. Grunnleggende styling og reponsivt grensesnitt	Pågår
Brukerkuntadministrasjon (MVP sikkerhet)	1	Lage enkel brukerprofil	Registrering med e-post/passord for innlogging. Håndtere autentisering. Opprettholde GDPR	Pågår
Opprettelse av anmeldelser	1	Bruker skal kunne skrive og publisere anmeldelse	Tekstfelt som kobler anmeldelse til bolig/utleier. Enkel validering	Pågår
Søkefunksjonalitet	1	Bruker skal kunne søke etter bolig/sted	Søkeinput, filtrering etter navn/sted, vise søkeresultater, håndtere tomt søk	Pågår
Datamodell og database arkitektur	2	Lagring av data (anmeldelser, bilder, søkeord, osv.)	Definere databaserelasjoner. Lagre anmeldelser i SQLite. Håndtere API-endepunkter	Planlagt
Se andres anmeldelser	2	Bruker kan lese andres anmeldelser etter å	Hente data fra database og vise det som en liste sortert etter dato.	Planlagt

		ha benyttet søkefunksjonalitet		
Utforsk og filtrerings forbedringer	2	Forbedre utforsk funksjonen og brukervennligheten. Retter ønsket innhold mot bruker	Filtrering etter sted. Implementere anbefalingslogikk til bruker	Planlagt
Notifikasjoner	2	Varsler til bruker ved nye anmeldelser for ønsket bolig/sted	Notifikasjonsstruktur med backend trigger og frontend visning	Planlagt
Rapportering	?	Redusere risiko for falske/krenkende anmeldelser	Rapporterings funksjon for bruker. Admin skal kunne slette/flagge innhold	Planlagt
Sikkerhet og GDPR overholdelse	?	Håndtere risikoene mot og i tilfellet av datainnbrudd og opprettholde personvern	Kryptere sensitiv data med AES-256, streng tilgangskontroll, håndtere personvernerklæring	Planlagt
